WOZO Monitor – juni 2023

Ministerie van VWS

Programma WOZO omvat een vijftal actielijnen die bijdragen aan de visie op wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen. Met de belangrijkste stakeholders zijn de actielijnen verder uitgewerkt in projecten en acties. In deze monitor zijn per actielijn, per onderwerpen de met de partijen afgestemde projecten, acties en planning daarvan opgenomen. De monitor sluit daarmee aan op het Programma WOZO dat in juli 2022 met partijen is vastgesteld.

Deze monitor biedt inzicht in de voortgang van Programma WOZO en maakt het mogelijk om waar nodig bij te sturen. De monitor wordt elk kwartaal geactualiseerd.

Het Programma WOZO en deze monitor bevatten de volgende actielijnen:

- Actielijn 1. Samen vitaal ouder worden
- Actielijn 2. Sterke basiszorg voor ouderen
- Actielijn 3. Passende Wlz zorg
- Actielijn 4. Wonen en zorg voor ouderen
- Actielijn 5. Arbeidsmarkt en innovatie

Q-Consult Zorg heeft op basis van documenten en op basis van interviews met trekkers van de Actielijnen de voortgang vastgelegd en beoordeeld.

Toelichting op de opzet van de Monitor

Per onderwerp binnen de actielijn wordt de voortgang weergegeven door middel van een stoplicht-kleur:

- Status kan niet worden beoordeeld
- Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
- Planning niet haalbaar en interventie benodigd
- Conform planning

Elk onderwerp omvat verschillende acties. **Per actie** is een planning opgenomen en geeft de monitor weer of de actie conform planning wordt uitgevoerd:

Legenda

- Planning
- Afwijking van planning
- Conform planning
- Afgerond anders dan gepland

Stand van zaken - De toelichting op de Stand van zaken (laatste kolom van de monitor) heeft dezelfde strekking als de toelichting in bijlage "Stand van zaken". De monitor wordt elk kwartaal geactualiseerd.

WOZO Monitor

Ministerie van VWS

Actielijn 1. Samen vitaal ouder worden

Legenda
- Planning
- Afwijking van planning
- Status kan niet worden beoordeeld
- Conform planning
- Conform planning
- Afgerond anders dan gepland
- Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
- Planning niet haalbaar en interventie benodigd

Consult Zorg
Brengt verandering in de praktijk.

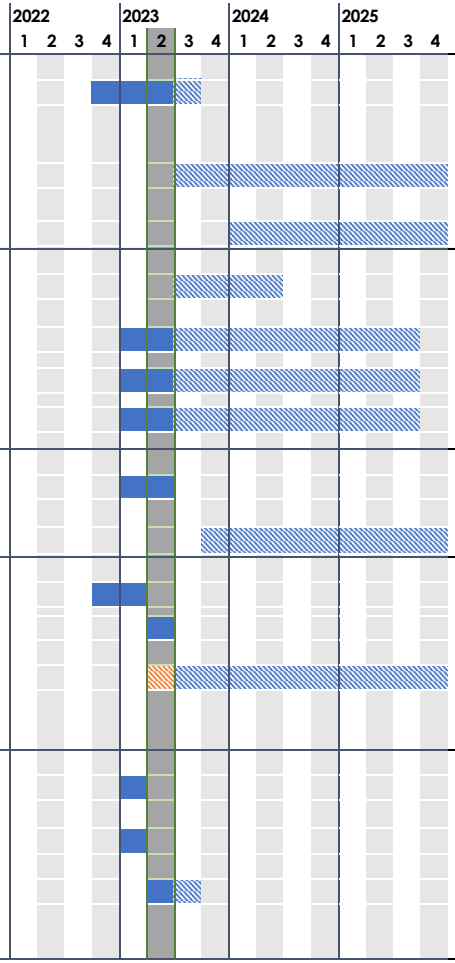

DOEL	ONDERWERP	Stand van zaken
1	**Voorbereiden op ouder worden**	
	Voorbereiden campagne 'praat vandaag over morgen'	In 2020 is Actiz gestart met de publiekscampagne "Praat vandaag over morgen". VWS is in gesprek met ActiZ over opschaling van publiekscampagne "Praat vandaag over morgen".
	Ontwikkeling van campagne	De planning is dat tweede helft van 2023 wordt gestart met de ontwikkeling van de campagne/communicatieaanpak.
	Start en uitrol van campagne	
2	**Vitaal ouder worden - gezond leven**	
	Afspraak in GALA over: versterken uitvoering artikel 5a 'Ouderengezondheidszorg'	Planning is dat onderzoek naar artikel 5a na de zomer door VWS wordt opgestart.
	Afspraak in GALA over: gezonde voeding bij ouderen	Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.
	Afspraak in GALA over: bewegen door ouderen	Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.
	Afspraak in GALA over: valpreventie bij ouderen	Zie het GALA voor afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars.
3	**Samen ouder worden**	
	Programma voorstel 'samen ouder worden 2.0'	Subsidieaanvraag Samen Ouder Worden 2.0 is ingediend. De planning is dat dit programma oktober 2023 van start gaat.
	Start vervolg programma	
4	**Intergenerationeel wonen**	
	Uitwerking stimuleringsregeling intergenerationeel wonen	Conceptversie voor subsidieregeling intergenerationeel wonen gereed.
	Start internet consultatie	Op 31 mei is internetconsultatie subsidieregeling intergenerationeel wonen gestart. Internetconsultatie sluit op vrijdag 23 juni.
	Openstelling regeling intergenerationeel wonen	Planning is dat de regeling begin juli open wordt gesteld. Beoogd was om de regeling in Q2 van 2023 open te stellen, maar de inhoudelijke uitwerking van de regeling heeft meer tijd gekost.
5	**Versterken van de ondersteuningsstructuur**	
	Afspraak in GALA over versterken sociale basis	In het GALA zijn met gemeenten afspraken gemaakt over het versterken van de sociale basis.
	Gemeenten kunnen SPUK aanvragen	Middels de brede SPUK hebben gemeenten middelen ontvangen voor het versterken van de sociale basis.
	Visie brief over de sociale basis (en een uitvoeringsagenda mantelzorg) naar de Tweede Kamer	Op dit moment wordt gewerkt aan een concrete aanpak, inclusief een mantelzorgagenda. Hierover wordt de Kamer voor het zomerreces geïnformeerd.

DOEL	ONDERWERP	Jaar / Kwartaal	2022 1 2 3 4	2023 1 2 3 4	2024 1 2 3 4	2025 1 2 3 4	Stand van zaken
6	**Inzet op reablement**						
	Kennisontwikkeling (ZonMw) en plan van aanpak opzetten						ZonMw programma "reablement" is begin 2023 gestart.
	Oplevering onderszoeksrapport AEF in opdracht van VWS						AEF rapport is eind 2022 opgeleverd. Dit rapport werd goed ontvangen door veldpartijen.
	Webinar reablement (georganiseerd met ActiZ, ZorgthuisNL en de VNG)						Webinar heeft plaatsgevonden en is goed bezocht.
	ZonMw Subisidieoproep doorontwikkelaars						Eerste ronde voor doorontwikkelaars is inmiddels opengesteld. Tweede ronde wordt einde van dit jaar verwacht. Eerste ronde bestaat uit vier organisaties (op uitnodiging) en wordt ingezet als kennisbron.
	ZonMw Subisidieoproep starters reablement						
	Uitvoering projecten						
7	**Innovatieve vormen van samenwerking**						
	Kennisagenda 'versterking ondersteuning ouderen' opzetten voor de regionale werkplaatsen						Subsidies zijn toegekend aan de 15 werkplaatsen Sociaal Domein en aan Movisie ter ondersteuning van associatie werkplaatsen Sociaal Domein. De 15 werkplaatsen hebben in samenwerking met hun partners een kennisagenda opgesteld die in de komende maanden verder wordt uitgewerkt.
	Uivoering kennisagenda						
8	**Onderzoek naar de voorliggendheid van de Wlz**	**Herbeoordeling**					
	Mogelijk aanpassen van mogelijkheid om ondersteuning te weigeren als inwoners voldoen aan de Wlz-criteria.						Deze activiteit staat tijdelijk on hold. Afweging hierbij is dat er vanuit meerdere trajecten, waaronder ook de GGZ in de Wlz, wordt nagedacht over de voorliggendheid van de Wlz op de Wmo. Er wordt daarom eerst afgewogen welke (samenhangende) aanpak het beste aansluit bij een onderzoek naar de voorliggendheid.

WOZO Monitor

Ministerie van VWS

Actielijn 2. Sterke basiszorg voor ouderen

Legenda
- Planning
- Afwijking van planning
- Status kan niet worden beoordeeld
- Conform planning
- Conform planning
- Afgerond anders dan gepland
- Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
- Planning niet haalbaar en interventie benodigd

Consult Zorg
Brengt verandering in de praktijk.

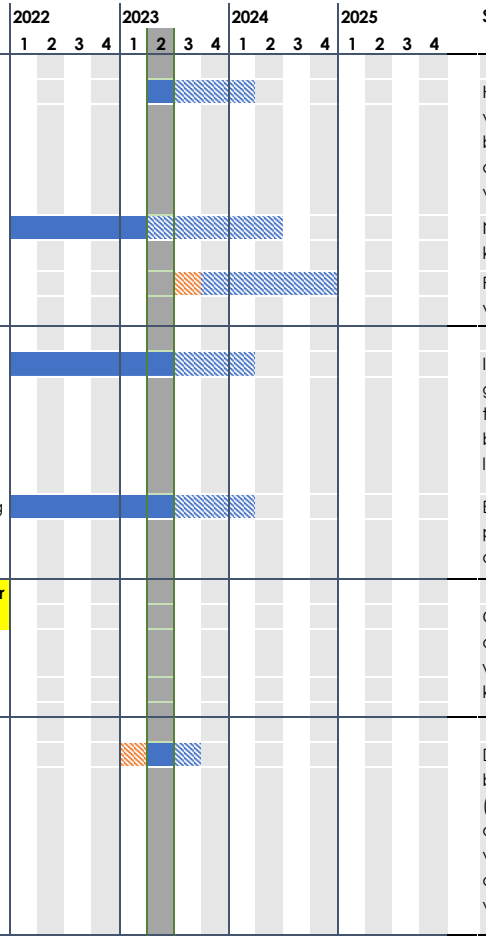

DOEL	ONDERWERP	Stand van zaken
1	**Implementatie Handreiking Kwetsbare Ouderen Thuis**	
	Herijking handreiking	Handreiking is in 2021 gepubliceerd. Partijen hebben eind 2022 een plan van aanpak voor verdere implementatie opgeleverd. Partijen hebben behoefte aan herijking van de handreiking. Richting de zomer een activiteitenplan voor vervolgsubsidie. VWS heeft contact met InEen over vervolgsubsidie.
	Bekostigingsadvies aan NZa	Nza advies is in 2022 gestart. In Q4 wil VWS met vervolgadvies aan NZa komen aansluitend bij visie op eerstelijnszorg. Dit loopt t/m Q2 2024.
	Implementatie Handreiking	Planning is starten in Q2 2024 met looptijd t/m 2025 (planning is iets vertraagd, door toevoegen van tussenstap van herijking handreiking).
2	**Aanspreekbare- en herkenbare teams in de wijk (IZA)**	
	Onderzoek RIVM naar ontwikkelingen op landelijk niveau	In meerdere regio's en wijken zijn zorgaanbieders gestart met invulling geven aan de afspraken over de herkenbare en aanspreekbare (H&A) teams. RIVM doet t/m 2023 onderzoek naar de ervaringen van betrokkenen bij regionale projecten. In Q1 2024 volgt daarover een laatste rapportage.
	Passende bekostiging en inkoop voor aanspreekbare en herkenbare wijkverpleging	Er wordt gewertk aan een bekostigingstitel in de regelgeving van de NZa per 1 januari 2024, zodat zorgverzekeraars en aanbieders hier afspraken over kunnen maken.
3	**Gezamenlijke triage- instrumenten voor kwetsbare oudere (IZA)** Herbeoordeling	
	Herziening en verbreding van bestaande triage-instrumenten	Op dit moment wordt er geen actieve opvolging gegeven aan deze actie. Nadat de gesprekken over kwaliteitsprogramma zijn afgerond wordt opnieuw bekeken of herzieining van traigeinstrumenten in het kader van WOZO nodig is.
	Goede initiatieven op grote schaal bevorden	
4	**Vereenvoudiging aanspraken van betaaltitels voor tijdelijk verblijf**	
	In kaart brengen acties en gevolgen vereenvoudiging aanspraken	De planning is om in de zomer van 2023 te starten met het in kaart brengen van de acties en gevolgen van vereenvoudiging aanspraken (iets later dan gepland). In het plan van aanpak worden relevante ontwikkelingen meegenomen die eraan bijdragen dat er minder verblijftitels zijn. In de zomer wordt aan plan van aanpak gewerkt en na de zomer volgen gesprekken met partijen. In Q3 van 2023 wordt het plan van aanpak opgeleverd.

DOEL	ONDERWERP	Jaar / Kwartaal	2022 1 2 3 4	2023 1 2 3 4	2024 1 2 3 4	2025 1 2 3 4	Stand van zaken
5	**Definities van goede zorg voor eerstelijnsverblijf, geriatrische**						
	Vervolg geven aan Beter Thuis						Een nieuw programmavoorstel wordt door ZonMw opgeleverd in Q3 van 2023. ZonMw zal o.b.v. vier goede voorbeelden m.b.t. een andere manier van inrichten van eerstelijnsverblijf een beperkte indicatorenset voor monitoring uitkomsten van experimenten ontwikkelen.
	Doorontwikkeling prestatiestructuur en tarifering (ELV en SO)						Gestart Q4 2022, 1 januari 2025 zou het gereed moeten zijn.
6	**Ontwikkeling en positionering van ambulante geriatrische revalidatiezorg**						
	Kaders om afspraken te maken over ambulante GRZ						ActiZ en ZN hebben gezamenlijke kaders opgesteld om (financiële) afspraken te maken over ambulante GRZ (vastgesteld in Q1 2023). Vanuit Beter Thuis is eind januari subsidie verleend aan het GRZ project 'Thuis als het kan'. De uitkomsten van deze proeftuinen worden wetenschappelijk onderzocht door Maastricht University en het Leids Universitair Medisch Centrum.
	Aanpassing wet- en regelgeving Bzv (artikel 2.5c)						Aanpassing wet- en regelgeving start in Q3 2023 tot 1 januari 2025.
	Passende bekostiging ambulante grz						Inrichting van de bekostiging start vanaf Q3 2024 en moet op 1 januari 2026 gereed zijn. NZa kan na aanpassing aanspraak op GRZ (i.h.k.v. ambulante GRZ) herzieningen in wet- en regelgeving van de bekostiging verder verkennen.
	Experimenten ambulante GRZ in het veld						Zorgverzekeraars worden door zorgaanbieders nog weinig benaderd om afspraken te maken over ambulante GRZ in de keten (naast de projecten die lopen in het kader van "Thuis als het kan"). ZN en ActiZ zijn aan zet voor aanjagen van meer experimenten en verder invulling geven aan de kaders.
7	**Extramurale farmaceutische zorg voor ouderen**						
	Vastleggen gezamenlijke toekomstvisie en werkafspraken						De 7 uit te werken thema's in dit traject zijn goedgekeurd in het bestuurlijk overleg Extramurale Farmaceutische Zorg van 8 februari 2023. Er wordt in de zomer 2023 een gedeelde visie en bijbehorende werkafspraken op de 7 thema's vastgelegd, waar VWS samen met de betrokken veldpartijen tot aan 2030 uitvoering aan zal geven.
	Uitvoering in het veld						Afhankelijk van werkafspraken zijn doelstellingen voor uitvoering in veld bekend met planning (wordt later aangevuld).
8	**Mondzorg voor thuiswonende ouderen**						
	Plan van aanpak voor verbeteren mondzorg voor kwetsbare ouderen						Er wordt momenteel met partijen gewerkt aan een plan van aanpak. Dat plan van aanpak wordt in Q3 van 2023 vastgesteld.
	Uitvoering in het veld						Uitvoering loopt van Q4 2023 t/m 2025.

WOZO Monitor

Ministerie van VWS

Actieliin 3. Passende Wlz zora

Legenda

- Planning
- Afwijking van planning
- Status kan niet worden beoordeeld
- Conform planning
- Conform planning
- Afgerond anders dan gepland
- Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
- Planning niet haalbaar en interventie benodigd

Consult Zorg
Brengt verandering in de praktijk.

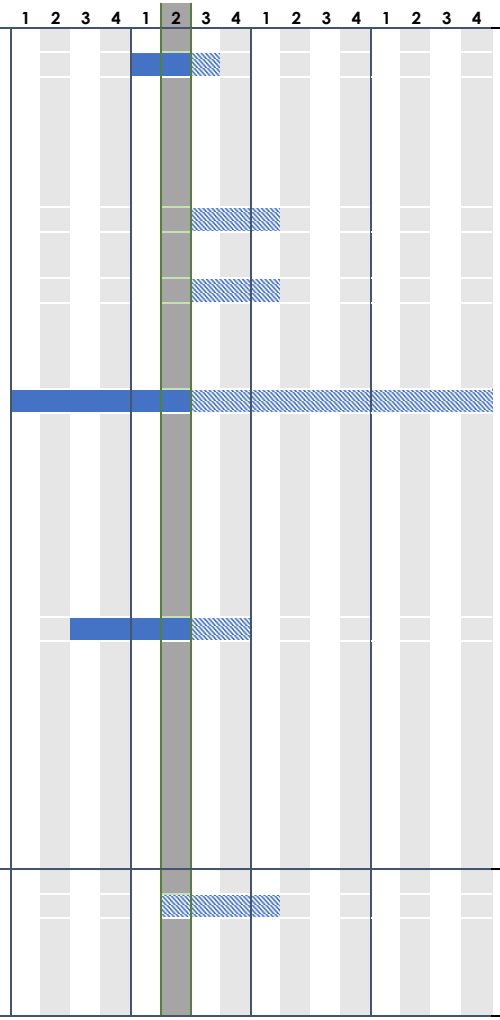

DOEL	ONDERWERP	Stand van zaken
1	**Scheiden van wonen en zorg**	
	Vaststellen 4800 onomkeerbare verpleeghuisplaatsen	Het uitgangspunt: aantal verpleeghuisbedden blijft constant (125.000 verpleeghuisbedden gecontracteerd), vertaalt ZN naar inkoopbeleid. ZN heeft de bouwplannen van de zorgaanbieders opnieuw beoordeeld aan de hand van de gestelde criteria en zal voor 1 juli de resultaten van deze beoordeling bekend maken. Extra verpleeghuisplaatsen worden tijdelijk tegen intramuraal tarief vergoed.
	Opgave productieafspraken verpleeghuizen vpt/mpt/pgb 2023	Het Inkoopbeleid is 1 juni door ZN gepubliceerd. Zorgkantoren zullen dit landelijke kader vertalen naar het zorgkantoor specifiek inkoopbeleid. Uitgangspunt is dat zorgkantoren niet meer bedden gaan inkopen, dan huidige aantal met uitzondering van bedden die samenhangen met de onomkeerbare plannen. Periodiek komt via de monitor langdurige zorg informatie beschikbaar over het door het zorgkantoor gecontracteerde aantal zzp's met verblijf, VPT, MPT en PGB.
	Inkoopafspraken ZN inkoopbeleid zorgkantoren 2024	
	Regiomonitor bouw verpleegzorgplaatsen 2023	De exacte lijst met monitorgegevens over het aantal woningen voor ouderen (waaronder de 40.000 verpleegzorgplekken), die naar de Kamer zal worden verstuurd, moet nog worden vastgesteld. Hierover vindt overleg plaats tussen VWS (als onderdeel van actielijn 4) en BZK. ZN rapporteert jaarlijks (in december) over het aantal verpleegzorgplekken dat is opgenomen in de bouwprognoses van zorgaanbieders (uitgesplitst naar verpleeghuizen en geclusterde woningen met SWZ). In afstemming met ZN wordt bekeken hoe cijfers over bouwrealisatie daaraan toegevoegd kunnen worden.
	Visievorming m.b.t. onderscheid on-/geclusterde vpt	Door het scheiden van wonen en zorg zal het gebruik van VPT toenemen. De vraag die dan opkomt is of de vormgeving (zowel inhoud als bekostiging) van VPT nog wel adequaat is. Tegen deze achtergrond zijn meerdere adviezen gevraagd aan de NZa, die deels al inzicht bieden in het huidige gebruik van VPT (eerstvolgende advies komt zomer 2023). Ook is er afstemming met de zorgkantoren over de inzet van VPT thuis en in de geclusterde setting (op welke wijze wordt VPT nu ingekocht, welke aandachtpunten zijn daarbij van belang). Deze adviezen en waarnemingen zullen vervolgens door VWS worden vertaald in beleidsopties die aan de minister kunnen worden voorgelegd.
2	**Toegang tot aanspraak op verblijf**	
	Opdracht aan ZINL	ZIN is op 12 juni jl. gevraagd om onderzoek te doen naar het omslagpunt voor Wlz-zorg met verblijf en Wlz-zorg zonder verblijf. ZIN reageert binnen twee maanden of het onderzoek uitvoerbaar is en zal het onderzoek daarna ter hand nemen. Het eindrapport wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

DOEL	ONDERWERP	Jaar / Kwartaal	2022 1 2 3 4	2023 1 2 3 4	2024 1 2 3 4	2025 1 2 3 4	Stand van zaken
3	**Inzet regiobudgetten**						Er zijn 2 budgetten die in de zorginkoop worden ingezet: 1) Regiobudget scheiden wonen en zorg 2) Stimuleringsbudget Wlz Het betreft in totaal € 70 mln per jaar over de jaren 2022 t/m 2026. Zorgkantoren maken hierover afspraken met zorgaanbieders in de inkoop. Verantwoording dient jaarlijks plaats te vinden in het eerste half jaar. Verantwoording heeft voor zowel regiobudget als stimuleringsbudget nog niet plaats gevonden.
	Regiobudget scheiden wonen en zorg						
	Stimuleringsbudget wlz						
4	**Waardigheid en trots**						
	Ondersteuning van zorgaanbieders						Zorgaanbieders kunnen zich bij Waardigheid en Trots aanmelden voor ondersteuning bij het maken van de transitie. Zorgaanbieders krijgen geen financiële middelen, maar ondersteuning in het implementatietraject. Doel van de ondersteuning vanuit Waardigheid en Trots: Bijdragen aan WOZO actielijnen door zorgaanbieders te helpen in het veranderproces. Doelgroep: Aanbieders die o.a. Wlz-zorg leveren. Er zijn drie informatiebijeenkomsten geweest, waar ruim 250 aanmeldingen voor waren. Daaruit blijkt interesse uit het veld. Vilans (uitvoerder van Waardigheid en Trots) rapporteert periodiek over de resultaten van de ingezette trajecten. In de brief van december 2023 zal de Kamer hierover geïnformeerd worden.
5	**Doorontwikkeling kwaliteitskader**						
	Concept kwaliteitskompas gereed						Op 24 maart j.l. is het Kwaliteitskompas aan het Zorginstituut voor toetsing aangeboden. Het ZIN heeft het toetsingsproces van het kwaliteitskompas inmiddels doorlopen. Na de achterbanraadpleging hebben VenVN, Verenso, PFN en ZN aangegeven het kompas op dit moment nog niet voldoende te steunen. Hiervoor is nog nadere uitwerking nodig op de verschillende punten. Het Zorginstituut heeft besloten partijen extra tijd te geven om op korte termijn een gedragen procesvoorstel voor de concretiseringslag te maken. Het Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan', inclusiefmeetinstrumenten, moet uiterlijk 1 december 2023 klaar zijn (dat was de oorspronkelijke planning en is nog steeds haalbaar). Aan het kwaliteitskompas is een taakstelling verbonden (100 miljoen in 2024 en oplopend tot 350 miljoen in 2027).
	Aanbieding aan ZINL						
	Inschrijving in register en vervallen huidige kwaliteitskader verpleeghuizen en addendum,						
	Doorontwikkeling wijkverpleging en wmo, mogelijk vervallen kwaliteitskaders wijkverpleging en palliatieve zorg						Proces vanaf 2024 afhankelijk van de inhoud van het kwaliteitskompas.
6	**Experimenten domein overstijgende initiatieven**						
	Openstellen SPUK-regeling						In februari 2023 is de eerste ronde van de subsidieregeling (SPUK) opengesteld. Er zijn 9 nieuwe aanvragen gehonoreerd naast de 3 al lopende. In juni-juli nieuwe ronde, van 27 juni 2023 t/m 11 juli 2023. Aan de SPUK zitten verantwoordingseisen vast. Op basis van de verantwoording wordt in beeld gebracht wat de effecten zijn van ingezette middelen.

DOEL	ONDERWERP	Jaar / Kwartaal	2022 1 2 3 4	2023 1 2 3 4	2024 1 2 3 4	2025 1 2 3 4	Stand van zaken
7	**Wetsvoorstel Domeinoverstijgende samenwerking** Wet DOS						Wet is door het kabinet aangeboden aan de Raad van State. Daarna volgt nog de parlementaire behandeling, waardoor ingang per 1-1-2024 moeilijk haalbaar is. Indien de Wet niet per 2024 in kan gaan, dan dient SPUK verlengd te worden.
8	**Meerjarig contracteren en sturingsinstrumenten zorgkantoren** Beleidsregels Nza 1 juli 2023						Aan deze maatregel zit een taakstelling vast, net als bij kwaliteitskompas. VWS stelt de budgettaire kaders voor de Wlz op, waarin deze beleidsmaatregel is verwerkt. ZN zal deze maatregel opnemen in het inkoopbeleid (basis meerjarig contract). De NZa zal de Beleidsregels aanpassen op 1 juli 2023. In de (voorlopige) kaderbrief Wlz 2024, die in juni 2023 zal worden verzonden en de brieven aan de Kamer is meer informatie opgenomen over stand van zaken op dit onderwerp. De monitoring van de meerjarencontractering wordt in afstemming met ZN ingericht.
9	**Kennisinfrastructuur en passende zorg Wlz** Advies van ZIN zomer 2022						Op 23 maart 2023 is er een brief naar de TK verstuurd over dit onderwerp. Eind 2024 wordt opnieuw brief naar TK gestuurd.

WOZO Monitor

Ministerie van VWS

Actielijn 4. Wonen en zorg voor ouderen

Legenda
- Planning
- Afwijking van planning
- Status kan niet worden beoordeeld
- Conform planning
- Conform planning
- Afgerond anders dan gepland
- Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
- Planning niet haalbaar en interventie benodigd

Consult Zorg
Brengt verandering in de praktijk.

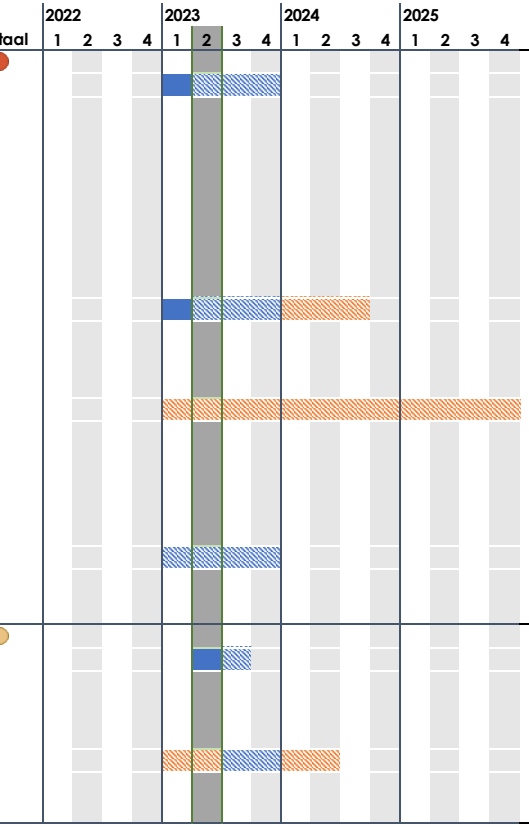

DOEL	ONDERWERP	Stand van zaken
1	**Versnelling woningbouw - Regie op ouderenhuisvesting**	
	Verdeling van regionale huisvestingsopgave voor ouderen per gemeente in regionale actietafels	Er zijn in alle Provincies regionale woondeals afgesloten. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met alle provincies om binnen deze 900.000 woningen, 290.000 woningen voor ouderen te realiseren. Hiertoe worden nu regionale actietafels wonen en zorg opgezet, zodat voor het eind van 2023 afspraken zijn gemaakt tussen provincie en gemeenten over de verdeling van de opgave m.b.t. nultredenwoningen, geclusterd wonen en geclusterde verpleegzorgplekken. Alle provincies hebben startgesprekken gehad met BZK, de verdere voortgang verschilt per regio.
	Inbedding bij het wetsvoorstel versterking regie op de ouderenhuisvesting	De internetconsultatie van de wet vond plaats tussen 16-02-2023 en 30-03-2023. De wet bevindt zich momenteel nog in de voorbereidingsfase en is nog niet ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. De beoogde ingangsdatum was per 01-01-2024, maar wordt geschat op Q3 2024.
	Verbinding regionale woondeals met de volkshuisvestingsprogrammas	De opgave die voortvloeit uit de regionale actietafels krijgen hun weerslag in woonzorgvisies met bouwambities, welke na regionale afstemming op lokaal niveau worden vastgesteld: de volkshuisvestingsprogrammas. De initiële planning was om deze per 01-01-2024 rond te hebben. Deze planning is echter niet reeël gebleken wegens vertraagd bouwproces en bijgesteld naar 01-01-2026.
	Opstellen en organiseren kennistrajecten	Handreiking geclusterd wonen (bedoeld voor professionals) is deze zomer gereed. Kennisdeling van verschillende aspecten van het programma loopt gedurende het hele jaar (informatiesessies, workshops etc.).
2	**Versnelling woningbouw - Realisatie van verpleegzorgplekken**	
	Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen	VWS en BZK werken de regeling in overleg met betrokken partijen uit. De regeling zal begin van de zomer 2023 ter consultatie worden voorgelegd en in september 2023 geopend worden. De Rijksoverheid stelt maximaal €312 miljoen beschikbaar voor de regeling.
	Standaardisatietraject bouw verpleegzorgplekken	Gezamenlijk wordt een onderzoeksopdracht uitgezet om standaardisatietraject van verpleegzorgplekken verder vorm te geven. Dit proces heeft vertraging opgelopen en loopt tot Q3 2024.

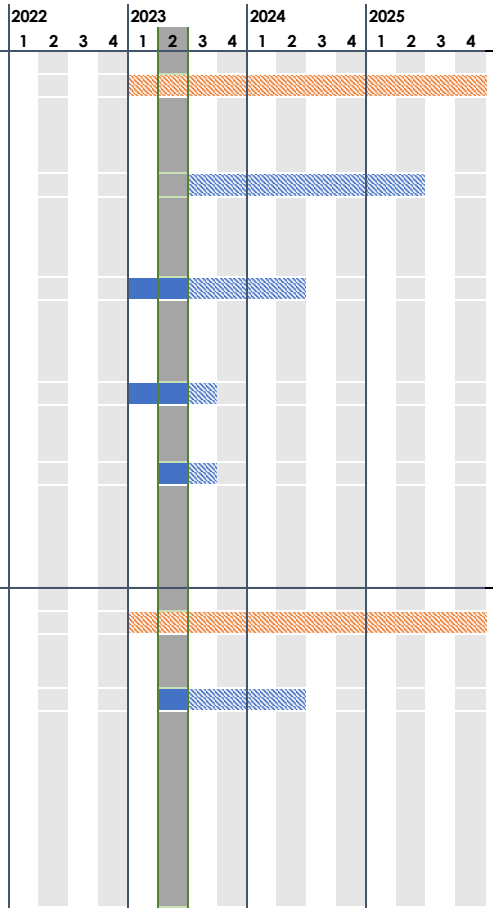

DOEL	ONDERWERP	Stand van zaken
3	**Ouderen informeren, ontzorgen en de doorstroming verbeteren**	
	Doostroming betrekken bij volkshuisvestingsprogrammas	In de volkshuisvestelijk programma's die op lokaal en regionaal niveau worden gesloten, wordt de inzet op doorstroming een vereiste. De initiële planning was om deze per januari 2024 rond te hebben en is bijgesteld naar januari 2026.
	Informatiecampagne over het toekomstbestendig wonen	De minister van VRO werkt samen met andere partijen aan een (informatie)campagne met als doel om ouderen beter te informeren over passend wonen. Deze campagne wordt ondersteund door een website en een app.
	Toolkit met algemene tools en beleidsinstrumenten	Platform31 is momenteel bezig met het opstellen van een toolkit met doorstromingsinstrumenten voor gemeenten. De toolkit voor de sociale sector (en de eerste bevindingen voor de particuliere sector) is dit najaar gereed. Deze wordt begin 2024 verder aangevuld.
	Financieel actieplan (bewustwording ouderen)	In het najaar van 2023 wordt door organisaties uit de bancaire sector een convenant ondertekend die de inzet op financiële informatie voor ouderen verbeterd.
	Gedragsonderzoek onder ouderen die weerstand voelen om te verhuizen	Er wordt een onderzoek uitgevoerd onder een diverse groep ouderen met als doel om meer inzicht te krijgen in wat ouderen beweegt om wél te verhuizen, welke aspecten behulpzaam waren tijdens het verhuisproces en welke voordelen zij ervaren van hun nieuwe woonsituatie. In september wordt dit onderzoek gestart.
4	**Leefomgeving**	
	Leefomgeving betrekken bij volkshuisvestingprogramma's	In de volkshuisvestingsprogrammas wordt ingegaan op de leefomgeving. De initiële planning was om deze per januari 2024 rond te hebben en is bijgesteld naar januari 2026.
	Gemeenten ondersteunen/inspireren aan de hand van ontwerpen	Samen met de Rijksbouwmeester en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving wordt in verschillende wijken aan de hand van concrete ontwerpen onderzocht hoe de omgeving kan worden aangepast zodat die meer uitnodigt tot bewegen en ontmoeting. Daarnaast hebben Platform31, RVS en LSA een programma opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij planvorming en concrete ontwerpen voor een leefomgeving die beweging en ontmoeting stimuleert. Gemeenten zijn uitgenodigd om aan het programma deel te nemen. Programma start in de tweede helft van 2023.

WOZO Monitor

Ministerie van VWS

Actielijn 5. Arbeidsmarkt en innovatie

Legenda
- Planning
- Afwijking van planning
- Status kan niet worden beoordeeld
- Conform planning
- Conform planning
- Afgerond anders dan gepland
- Risico's voorzien of vertraging t.o.v. planning
- Planning niet haalbaar en interventie benodigd

Consult Zorg
Brengt verandering in de praktijk.

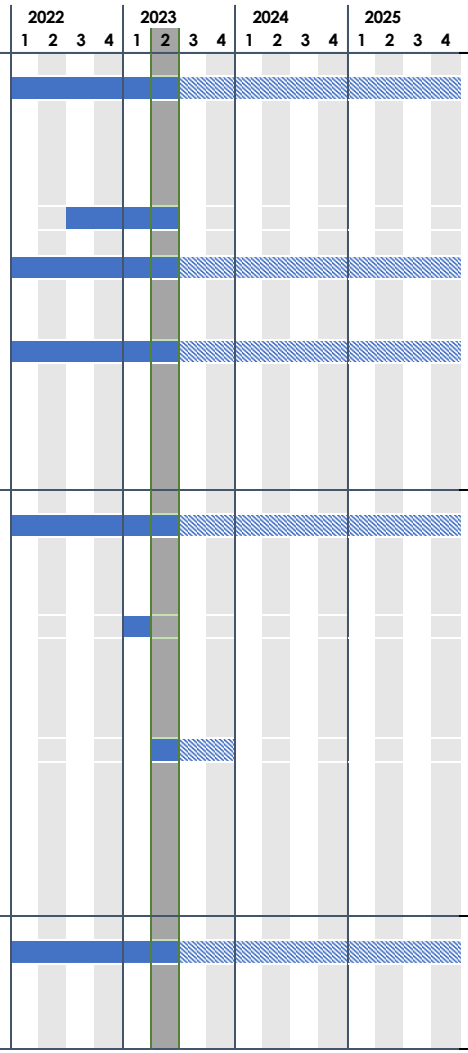

DOEL	ONDERWERP	Kwartaal	Stand van zaken
1	**Ruimte voor behoud door goed werkgeverschap en werkplezier**		
	Programma TAZ (professionele autonomie en zeggenschap, inwerken en begeleiding van nieuwe medewerkers, goede balans, gezonde en veilige werkomgeving)		Zie de voortgangsrapportage TAZ, deze verschijnt voor de zomer. Resultaten m.b.t. behoud en werkplezier: ZZP-beheersingsmodel Zorg, Preventieplan Zorg, Landelijke actieplan zeggenschap en subsidieregeling herstel (veerkracht) en zeggenschap. De acties voor deze onderwerpen zijn conform planning.
	Aanpassing Wet, kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor meer zeggenschap zorgmedewerkers		De aanpassing treedt 1 juli 2023 in werking en acties lopen conform planning.
	Via coaches van Waardigheid en Trots in de regio ondersteuning om in regionaal verband gezamenlijk te werken aan goed werkgeverschap		Coaches zijn in 2022 gestart en wordt tot en met 2026 ingezet. Regionaal goed werkgeverschap wordt verder financieel ondersteund met de regionale investeringsruimte (zie hieronder).
	Stimuleringsbudget Wlz voor modern werkgeverschap		Budget van jaarlijks € 30 miljoen is beschikbaar voor goed werkgeverschap en innovatie & technologie voor de periode 2022-2026. In de gehele periode (2018-2023) zijn inmiddels meer dan honderd projecten gericht op goed werkgeverschap gestart in de verpleegzorg. Een deel van de projecten is reeds afgerond. Ieder kwartaal starten nieuwe projecten.
2	**Ruimte voor leren en ontwikkelen**		
	Programma TAZ (voldoende instroom in de (vervolgopleidingen, aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt en maatschappij, veilig en inspirerend leerklimaat, leven lang ontwikkelen)		Zie de voortgangsrapportage TAZ, deze verschijnt voor de zomer. Belangrijke resultaat op gebied leren en ontwikkelen: Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging (zie ook onder). De acties voor deze onderwerpen lopen conform planning.
	Ondertekening investeringsakkoord opleiden wijkverpleging		Met Actiz, Zorgthuisnl, V&VN en ZN is op 17 maart 2023 een akkoord ondertekend waarmee komende drie studiejaren geïnvesteerd zal worden in het samen anders opleiden van helpenden (naar verzorgenden), verzorgenden IG en verpleegkundig-specialisten voor de wijkverpleging. Hier is eenmalig € 150 miljoen voor beschikbaar.
	Uitwerking investeringsakkoord opleiden wijkverpleging		Dit najaar start een subsidieregeling voor (regionale, domein-overstijgende) samenwerking rondom opleiden in de wijkverpleging. Ook starten dit najaar een viertal onderzoeken/verkenningen naar (1) kosten en baten van het opleiden in de wijkverpleging; (2) het verkrijgen van specifieke arbeidsmarkt data ; (3) het transmuraal opleiden en (4) scholing en opleiding van mantelzorgers. Deze verkenning zal eind 2023 worden afgerond.
3	**Ruimte voor innovatieve werkvormen**		
	Programma TAZ (inzet en opschaling van bewezen sociale-en technische innovaties, herijken van taken en functies, minder administratieve lasten)		Zie de voortgangsrapportage TAZ, deze verschijnt voor de zomer. Belangrijke resultaten op dit thema zijn: menukaart bewezen effectieve digitale en hybride zorgprocessen en vanaf de zomer voorlichting BIG. De acties voor deze onderwerpen lopen conform planning.

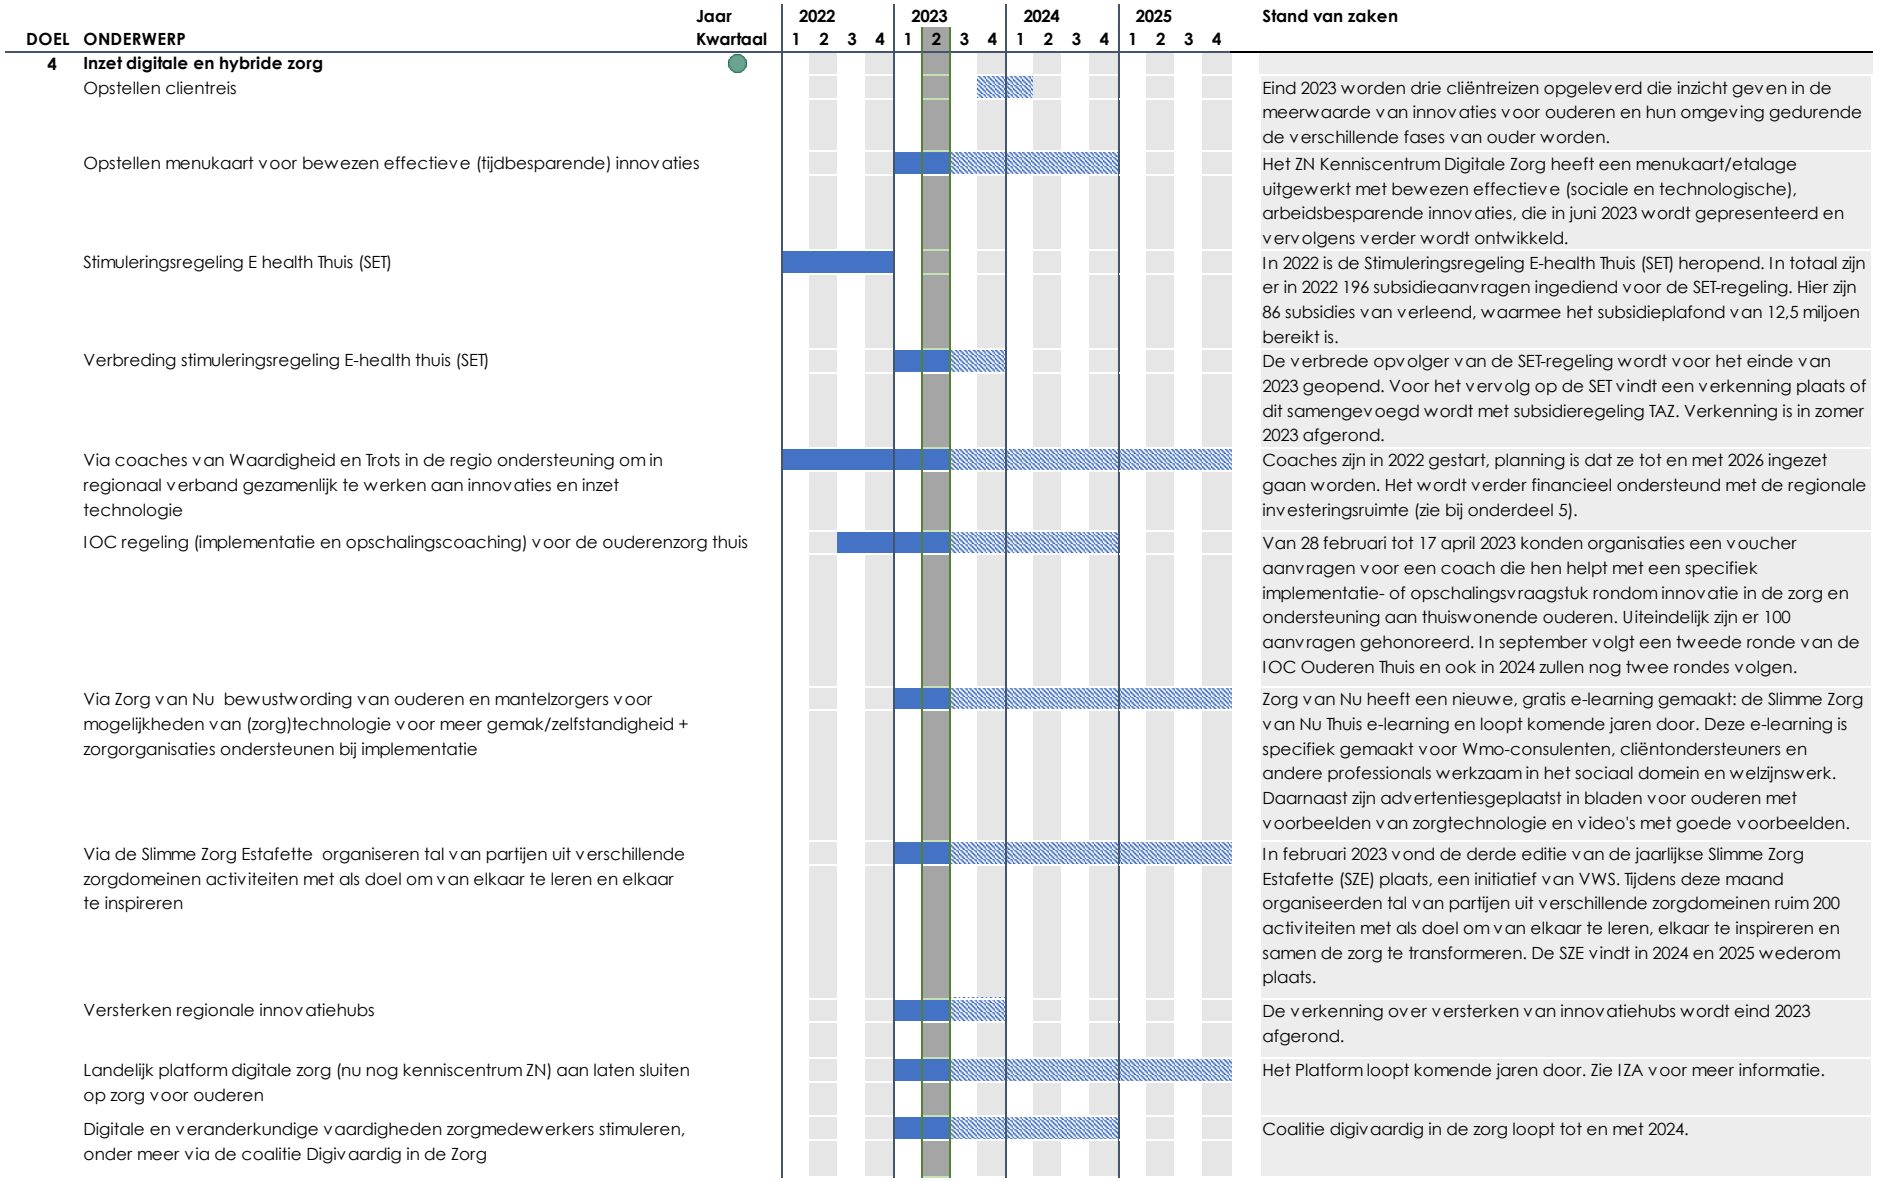

DOEL	ONDERWERP	Stand van zaken
4	**Inzet digitale en hybride zorg**	
	Opstellen clientreis	Eind 2023 worden drie cliëntreizen opgeleverd die inzicht geven in de meerwaarde van innovaties voor ouderen en hun omgeving gedurende de verschillende fases van ouder worden.
	Opstellen menukaart voor bewezen effectieve (tijdbesparende) innovaties	Het ZN Kenniscentrum Digitale Zorg heeft een menukaart/etalage uitgewerkt met bewezen effectieve (sociale en technologische), arbeidsbesparende innovaties, die in juni 2023 wordt gepresenteerd en vervolgens verder wordt ontwikkeld.
	Stimuleringsregeling E health Thuis (SET)	In 2022 is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heropend. In totaal zijn er in 2022 196 subsidieaanvragen ingediend voor de SET-regeling. Hier zijn 86 subsidies van verleend, waarmee het subsidieplafond van 12,5 miljoen bereikt is.
	Verbreding stimuleringsregeling E-health thuis (SET)	De verbrede opvolger van de SET-regeling wordt voor het einde van 2023 geopend. Voor het vervolg op de SET vindt een verkenning plaats of dit samengevoegd wordt met subsidieregeling TAZ. Verkenning is in zomer 2023 afgerond.
	Via coaches van Waardigheid en Trots in de regio ondersteuning om in regionaal verband gezamenlijk te werken aan innovaties en inzet technologie	Coaches zijn in 2022 gestart, planning is dat ze tot en met 2026 ingezet gaan worden. Het wordt verder financieel ondersteund met de regionale investeringsruimte (zie bij onderdeel 5).
	IOC regeling (implementatie en opschalingscoaching) voor de ouderenzorg thuis	Van 28 februari tot 17 april 2023 konden organisaties een voucher aanvragen voor een coach die hen helpt met een specifiek implementatie- of opschalingsvraagstuk rondom innovatie in de zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen. Uiteindelijk zijn er 100 aanvragen gehonoreerd. In september volgt een tweede ronde van de IOC Ouderen Thuis en ook in 2024 zullen nog twee rondes volgen.
	Via Zorg van Nu bewustwording van ouderen en mantelzorgers voor mogelijkheden van (zorg)technologie voor meer gemak/zelfstandigheid + zorgorganisaties ondersteunen bij implementatie	Zorg van Nu heeft een nieuwe, gratis e-learning gemaakt: de Slimme Zorg van Nu Thuis e-learning en loopt komende jaren door. Deze e-learning is specifiek gemaakt voor Wmo-consulenten, cliëntondersteuners en andere professionals werkzaam in het sociaal domein en welzijnswerk. Daarnaast zijn advertentiesgeplaatst in bladen voor ouderen met voorbeelden van zorgtechnologie en video's met goede voorbeelden.
	Via de Slimme Zorg Estafette organiseren tal van partijen uit verschillende zorgdomeinen activiteiten met als doel om van elkaar te leren en elkaar te inspireren	In februari 2023 vond de derde editie van de jaarlijkse Slimme Zorg Estafette (SZE) plaats, een initiatief van VWS. Tijdens deze maand organiseerden tal van partijen uit verschillende zorgdomeinen ruim 200 activiteiten met als doel om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen de zorg te transformeren. De SZE vindt in 2024 en 2025 wederom plaats.
	Versterken regionale innovatiehubs	De verkenning over versterken van innovatiehubs wordt eind 2023 afgerond.
	Landelijk platform digitale zorg (nu nog kenniscentrum ZN) aan laten sluiten op zorg voor ouderen	Het Platform loopt komende jaren door. Zie IZA voor meer informatie.
	Digitale en veranderkundige vaardigheden zorgmedewerkers stimuleren, onder meer via de coalitie Digivaardig in de Zorg	Coalitie digivaardig in de zorg loopt tot en met 2024.

DOEL	ONDERWERP	Jaar / Kwartaal	2022 1 2 3 4	2023 1 2 3 4	2024 1 2 3 4	2025 1 2 3 4	Stand van zaken
	Verbeteren van digitale vaardigheden van burgers/senioren als randvoorwaarden om te kunnen profiteren van technologie in zorg en ondersteuning						Er is een opdracht gegeven aan de Helpdesk Digitale Zorg tot verdere uitbreiding van hun dienstverlening om zo de zorg toegankelijker te maken voor patiënten en cliënten van zorgorganisaties door hen te helpen met vragen over digitale zorg. De Helpdesk Digitale Zorg is beschikbaar in 2023. VWS is in gesprek om de Helpdesk Digitale Zorg ook beschikbaar te stellen in 2024-2026. In het najaar van 2023 wordt hierover een besluit genomen.
	In 2025 wordt de generieke module digitale zorg gehanteerd door beroepsverenigingen bij alle nieuwe richtlijnen en kwaliteitsstandaarden en herijking van bestaande richtlijnen en standaarden en bekend bij patienten/clienten en zorgverleners.						Onder leiding van de Patientenfederatie wordt de generieke module digitale zorg begin 2025 opgeleverd. FMS en ZIN denken mee. Dit loopt volgens planning.
5	**Financiering digitale en hybride zorg**						
	Zorgaanbieders zetten meer in op gezamenlijk samenwerken en het inkopen van zorgtechnologie. VWS brengt huidige belemmeringen in kaart.						Eind 2022 is door PWC het onderzoek '"Eindrapport Centrale inkoop van digitale innovaties in de langdurige zorg - Verpleging & Verzorging" opgeleverd.
	Vraagstukken rondom financiering en bekostiging van zorgtechnologie worden in kaart gebracht en indien mogelijk opgelost zodat zij geen belemmering meer vormen bij opschaling en borging in reguliere processen.						Begin 2023 heeft de NZa het onderzoek Bekostiging en financiering van zorgtechnologie in de verpleegzorg opgeleverd.
	Het werken met dezelfde digitale toepassingen in de Wmo2015 en de Wlz wordt gestimuleerd, zodat de overgang voor cliënten en mantelzorgers soepel verloopt.						Hierover worden gesprekken gevoerd met zorgaanbieders die hiermee bezig zijn. Deze gesprekken zijn eind 2023 afgerond. Start 2024 wordt een plan van aanpak opgeleverd.
	Bezien wordt op welke wijze cliënten hun digitale zorgtoepassingen kunnen meenemen naar het verpleeghuis.						Hierover worden gesprekken gevoerd met zorgaanbieders die hiermee bezig zijn. Deze gesprekken zijn eind 2023 afgerond. Start 2024 wordt een plan van aanpak opgeleverd.
	Het zorgtransformatiemodel ZN en de ondersteuningsstructuur VWS wordt actief ingezet om de beweging naar een innovatie ecosysteem te maken en bewezen technologieën en zorgprocessen op te schalen.						Het eerder genoemde Landelijk Platform Digitale Zorg maakt gebruik van het zorgtransformatiemodel ZN en de ondersteuningsstructuur VWS. Het Platform loopt tot en met 2026 door. Zie IZA voor meer informatie.
	Zorgkantoren pakken een stevigere rol om aanbieders met zorgtechnologie te laten werken. Hiervoor wordt het Wlz inkoopkader vanaf 2024 gebruikt en wordt door VWS waar nodig een bepaling toegevoegd in de Wlz.						In Q3 en Q4 2023 vinden gesprekken plaats met zorgkantoren in het kader van Wlz-zorginkoopkader 2024-2026 en AMvB zorginkoop.
	Regionale investeringsruimte via de zorgkantoren - Stimuleringsbudget Wlz voorstimulans innovatie en technologie						Budget van jaarlijks € 30 miljoen is beschikbaar voor de periode 2022-2026. In de gehele periode (2018-2023) zijn inmiddels meer dan honderd projecten gericht op innovatie en technologie gestart in de verpleegzorg. Deels zijn ze afgerond, deels lopen nog. Ieder kwartaal

DOEL	ONDERWERP	Jaar / Kwartaal	2022 1	2	3	4	2023 1	2	3	4	2024 1	2	3	4	2025 1	2	3	4	Stand van zaken
	Onderzoek of en hoe een zogeheten AMvB zorginkoop vastgesteld kan worden met daarin voorwaarden voor de wijze waarop zorgkantoren in hun zorginkoopbeleid en contractafspraken met aanbieders sturen op de inzet van technologie/innovaties																		Hierover zijn gesprekken in Q2 en Q3 2023.
	Meer concrete interventies benoemen in de inkoop (sluiten van de loop tussen kenniscentrum en zorginkoop). AMVB zorginkoop in de langdurige zorg en gesprek met verzekeraars/zorgkantoren over pas toe en leg uit																		In Q3 en Q4 zijn gesprekken met zorgkantoren over toepassing Wlz-zorginkoopkader 2024-2026.
	Per 2025 zijn er in de Zvw, Wlz en Wmo daar waar mogelijk en wenselijk prikkels en meer ruimte voor digitale zorg. Dit resulteert in meer inhoudelijke afspraken over meer inzet van digitale/hybride zorg waar wenselijk en mogelijk																		Wlz-zorginkoopkaders 2024-2026 worden gescreend en zorgkantoren worden over de toepassing daarvan bevraagd. Planning is in Q3 en Q4 2023. Voor de Wmo worden er gesprekken gevoerd met de VNG. Zie IZA voor Zvw.
